


CRONOPROGRAMMA FASE TECNICO-AMMINISTRATIVA						
COMMESSA			PERIODO			SETTIMANA LAVORATIVA
	Attività	CONSEGNA	Durata (gg)	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
	FASE T/A PROGETTAZIONE	12/01/2023	701	10/02/21	701	12/01/23
FASE 1	AFFIDAMENTO INDAGINI E PROGETTAZIONE	08/08/2021	180	10/02/21	180	08/08/21
	AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE		180	10/02/21	180	08/08/21
FASE 2	ESECUZIONE RILEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	01/02/2022	90	08/08/21	90	05/11/21
	PROGETTAZIONE P.F.T.E.		60	05/11/21	60	03/01/22
FASE 3	P.T.O. E APPROVAZIONE DEL P.F.T.E.		30	03/01/22	30	01/02/22
	PROGETTO DEFINITIVO		90	01/02/22	90	01/05/22
	PARERI ED AUTORIZZAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO	06/10/2022	120	01/05/22	120	28/08/22
FASE 4	VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		40	28/08/22	40	06/10/22
	PROGETTO ESECUTIVO	12/01/2023	60	06/10/22	60	04/12/22
FASE 5	VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		40	04/12/22	40	12/01/23
	APPALTO DEI LAVORI	10/07/2023	180	12/01/23	180	10/07/23
	AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA		180	12/01/23	180	10/07/23



CRONOPROGRAMMA LAVORI						
COMMESSA			PERIODO			SETTIMANA LAVORATIVA
	Attività	CONSEGNA	Durata (gg)	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
	LAVORI	08/11/2027	1492	08/10/23	1492	08/11/27
FASE 1	VASCA DI COLMATA MOLO ROTUNDI	30/03/2025	540	08/10/23	540	30/03/25
	VASCHE DI COLMATA BANCHINA A TERRA		360	04/04/24	360	29/03/25
	GALLERIA SERVIZI ED IMPIANTI		540	08/10/23	540	30/03/25
	DRAGAGGIO PER NUOVO MOLO PUGLIESE E DARSENA NORD		240	04/04/24	240	29/11/24
FASE 2	COSTRUZIONE NUOVO MOLO PUGLIESE	18/09/2026	600	26/07/24	600	17/03/26
	COMPLETAMENTO DARSENA NORD E URBANIZZAZIONE, SALA OPERATIVA DI SUPPORTO		600	26/07/24	600	17/03/26
	CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO SUD		300	01/10/24	300	27/07/25
	CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO NORD		300	27/07/25	300	22/05/26
	COMPLETAMENTO VASCA COLMATA MOLO PUGLIESE ED IMPIANTI		360	24/09/25	360	18/09/26
FASE 3	DRAGAGGIO DARSENA GRANDE	08/11/2027	540	20/11/25	540	13/05/27
	COMPLETAMENTO BANCHINA A TERRA		540	20/11/25	540	13/05/27
	CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO EST		150	20/05/26	150	16/10/26
	REALIZZAZIONE DENTE DI ATTRACCO MOLO PUGLIESE		210	16/10/26	210	13/05/27
	COLLAUDI FINALI		180	13/05/27	180	08/11/27

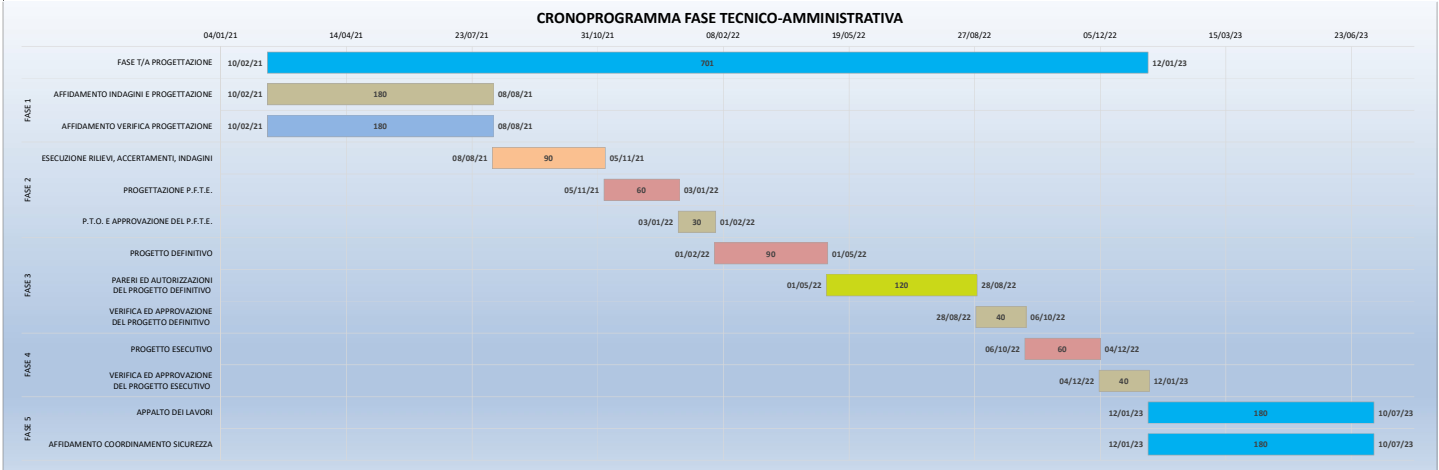
