

Arma la prora e salpa verso il mondo  
*Roberto Armar*



## PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



### TARANTO

#### PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DELL'ARSENALE MILITARE DI TARANTO


SERIE:	<b>GENERALE</b>	DESCRIZIONE:	<b>CRONOPROGRAMMA</b>
COD. PROG.	TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:
	<b>G08</b>	<b>G08_CRONOPROGRAMMA.pdf</b>	<b>N.N.</b>
PROGETTISTI:	T.V. (INFR) Ilaria Ing. BALDINI S.T.V. (INFR) Paola Arch. RISI		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	C.V. (INFR) Marcello Ing. TOMASSI		
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	APPROVAZIONI:
00	22/07/2020	EMISSIONE	
01	15/03/2021	REVISIONE	
02	01/09/2021	REVISIONE	
03	07/02/2022	REVISIONE	



MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO  
1° REPARTO – 3^ DIVISIONE

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO INTERVENTO

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA (GIORNI)
AFFIDAMENTO INDAGINI E PROGETTAZIONE	01-mar-22	26-nov-22	270
AFFIDAMENTO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	01-apr-22	27-dic-22	270
ESECUZIONE RILIEVI, ACCERTAMENTI INDAGINI	27-dic-22	27-mar-23	90
PROGETTO DEFINITIVO	27-mar-23	25-giu-23	90
PARERI ED AUTORIZZAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO	25-giu-23	23-ott-23	120
VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO EFINITIVO	23-ott-23	22-nov-23	30
PROGETTO ESECUTIVO	22-nov-23	21-gen-24	60
VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	21-gen-24	20-feb-24	30
TOTALE			960

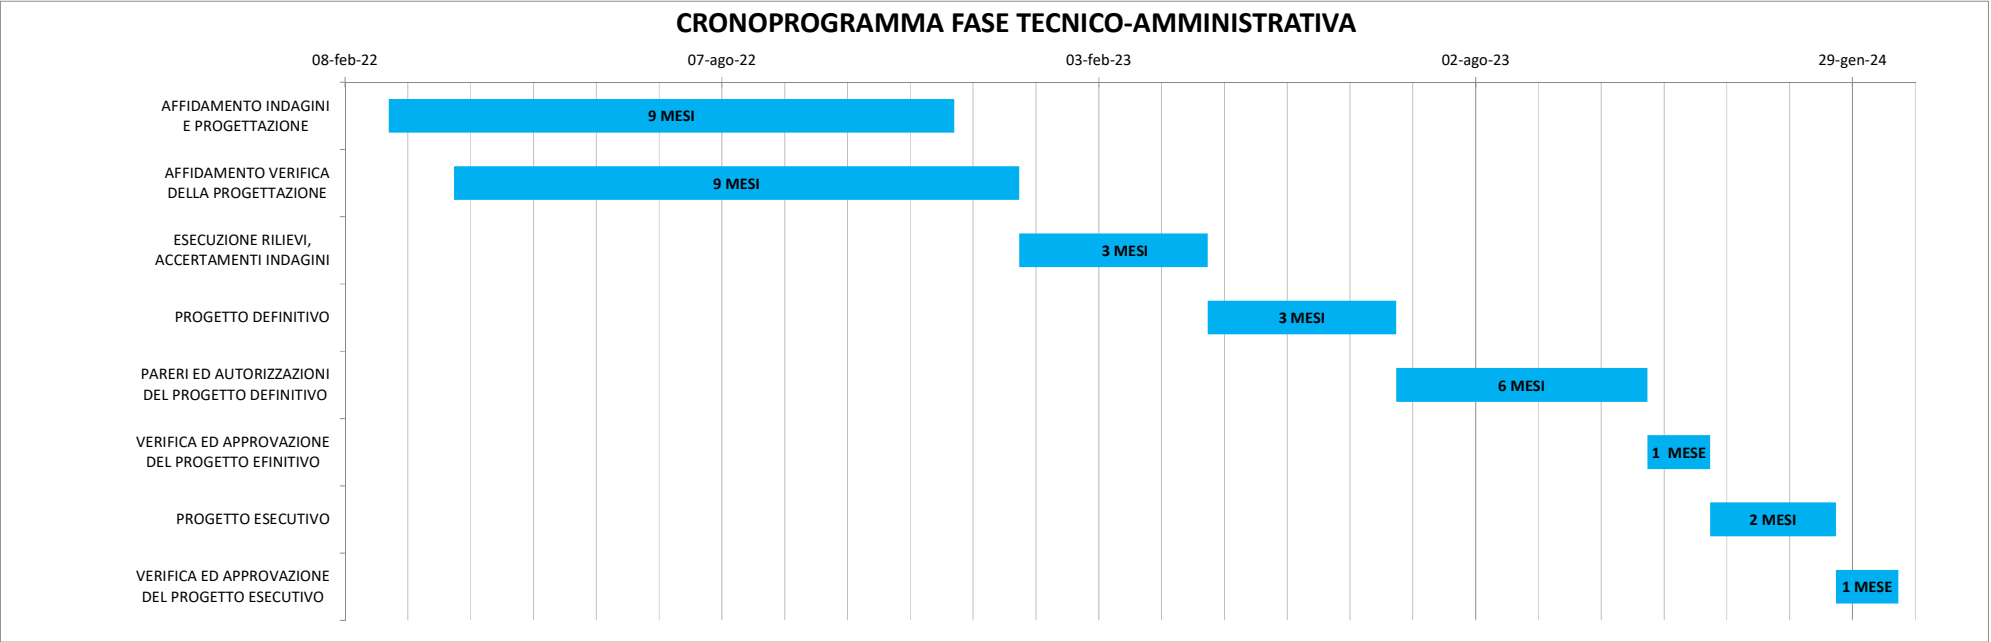

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA (GIORNI)
AFFIDAMENTO LAVORI	20-feb-24	14-feb-25	360
AFFIDAMENTO SERVIZIO CSE	20-feb-24	14-feb-25	360
LAVORI OFFICINA FORNI E FABBRI	14-feb-25	14-feb-27	730
LAVORI OFFICINA PICCOLI MOTORI	14-feb-26	09-giu-27	480
LAVORI SETTORE SCAFI	12-ott-26	04-apr-28	540
LAVORI PERCORSI DI VISITA	14-feb-26	02-ago-28	900
CSE	14-feb-25	02-ago-28	1265
COLLAUDI	02-ago-28	29-gen-29	180
TOTALE			4815

