CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Attività/Fase	Durata
1	LAVORI	210 g
2	ALLESTIMENTO E ORGANIZZ. DEL CANTIERE	6 g
3	Tracciamenti e preparazione area	2 g
4	Viabilità di cantiere	1 g
5	Realizzazione cantiere: elementi prefabbricati	2 g
6	Baracche di cantiere	2 g
7	Impianto elettrico di cantiere	2 g
8	Impianto idrico sanitario di cantiere	2 g
9	Impianto di terra di cantiere	2 g
10	PONTEGGIO	180 g
11	Installazione del ponteggio per le parti lunghe	2 g
12	Smontaggio del ponteggio	2 g
13	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEL G.E. D'EMERGENZA - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SMANTELLAMENTO	12 g
14	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	36 g
15	Rimozione dei gruppi elettrogeni	2 g
16	Demolizione canne fumarie	2 g
17	Demolizione e rimozione sanitari, cucine, centralini e infissi ferro e alluminio	2 g
18	Demolizione pavimenti, massetti, pilastri	12 g
19	STRUTTURE	36 g
20	Realizzazione pilastri e solai	20 g
21	Realizzazione muretti	12 g
22	OPERE EDILI	108 g
23	Rifacimento intonaco interno locali	2 g
24	Tinteggiature in locali	2 g
25	Realizzazione nuove canne fumarie	2 g
26	Realizzazione compartimentazione locale e sistemazione condotte interne	12 g
27	Rifacimento della pavimentazione nel locale G.E.	2 g
28	Incamiciatura e tappi di copertura	2 g
29	Realizzazione cavedi per impianti	2 g
30	Installazione dei serbatoi interrati	12 g
31	IMPIANTI TECNOLOGICI	138 g
32	Predisposizione nuova impiantistica	2 g
33	Sostituzione serbatoio di stoccaggio	2 g
34	Installazione ventilatori	12 g
35	Costruzione di impianto elettrico	12 g
36	Costruzione di impianto di terra	12 g
37	Costruzione di impianti speciali e realizzazione manuali	12 g
38	Installazione dei nuovi gruppi elettrogeni	12 g
39	Realizzazione delle nuove linee elettriche di potenza e collegamento circuiti ausiliari	12 g
40	Completamento delle reti di raffreddamento, di scarico e di alimentazione carburante	12 g
41	PROVE E COLLAUDI	16 g
42	Messa in funzione	2 g
43	Prove di funzionamento e taratura	2 g
44	Collaudi	2 g
45	Spegnimento G.E. di emergenza	2 g
46	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	6 g
47	Smontaggio impianti ad uso di cantiere	2 g
48	ULTIMAZIONE LAVORI	1 g

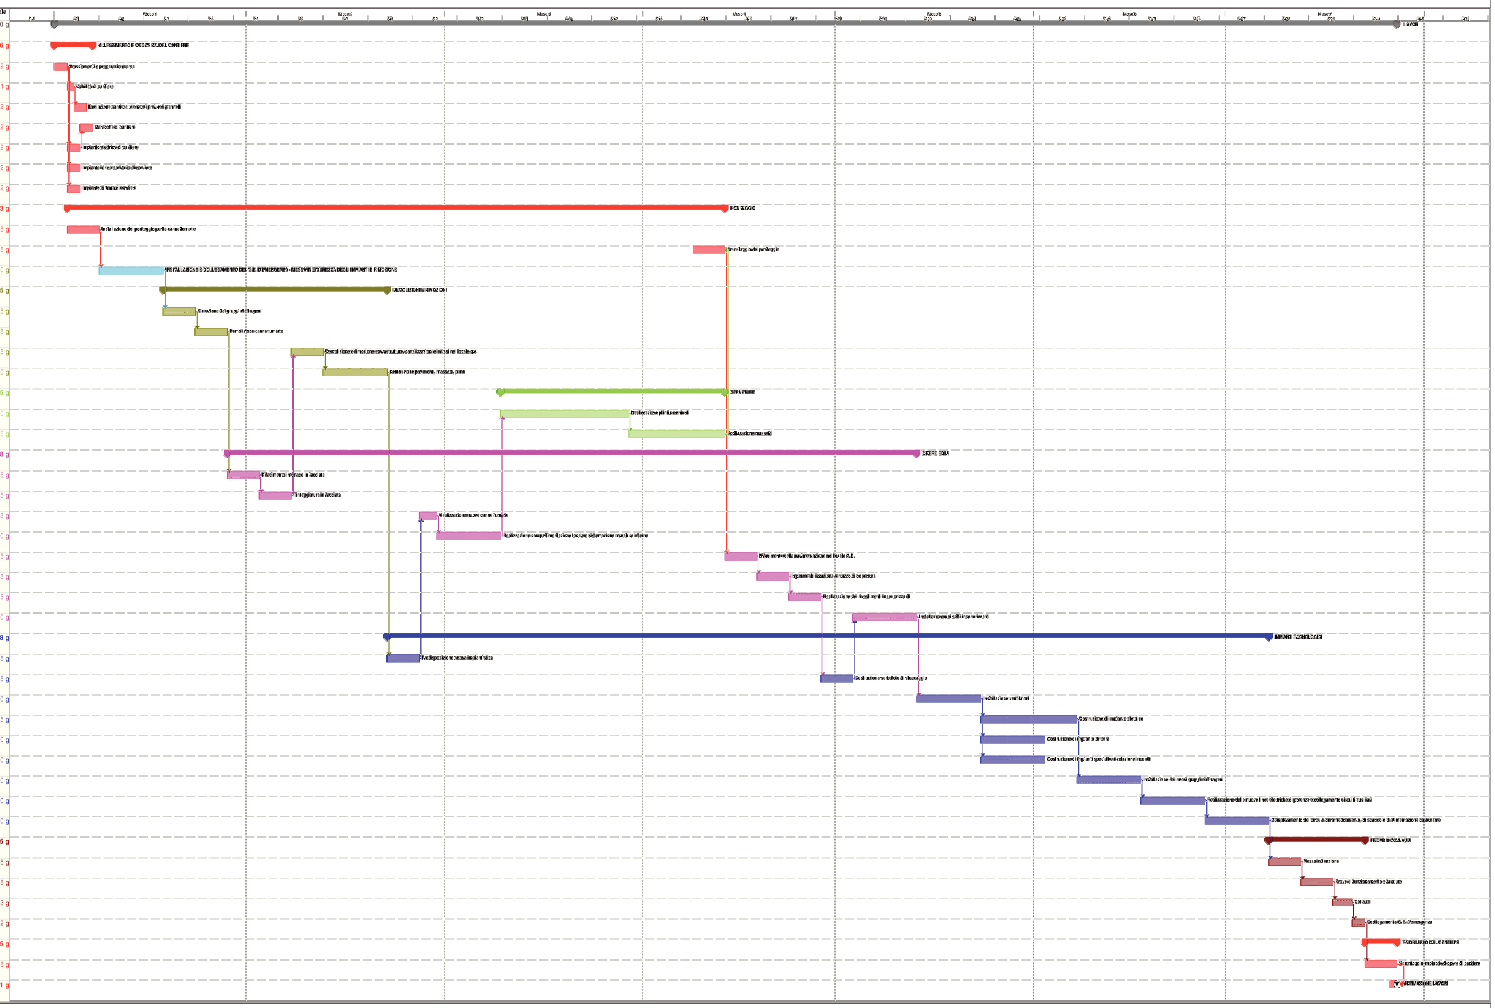

TEMPO CONTRATTUALE 210 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI
G.M. PER M.D.

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA, GRUPPI ELETTROGENI E LINEA PREFERENZIALE PRESSO PALAZZO ESERCITO - ROMA

FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

SERIE: DESCRITTIVA

DESCRIZIONE: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COD. PROGETTO: P RM 18 028 D

NOME FILE	IDENTIFICATIVO TAVOLA	SCALA	PLOT
18028_CL_501	CL 501	--	10:1

PROMEDIA

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)
Ing. Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Ercole Volpi
Arch. Nicola Ciarelli
Geom. Domenico Cimini Gianforte
Geom. Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Massimo Referza
Ing. Davide Fioretti

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing. Domenico Ropagnani
Ing. Paolo Coccia
P.Ind. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE
Geom. Valerio Pichelli
Geom. Amedeo Maria Bizzarri

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Col.g.(p.) Maurizio TICCONI

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	Settembre 2018	EMISSIONE	MGR	RDG	PDE

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.
